

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Одинцовский городской округ Московской области

Наименование проекта «Приобретение и установка оборудования для кабинетов труда МБОУ Ликинская СОШ»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
770000,00	481250,00	281050,00	7700,00	770000,00	481250,00	28050,00	7700,00	769998,00	481248,75	281049,27	7699,98	2,00	2,00	экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ по итогам проведения конкурсных процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций,
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 22.09.2020 / 30.09.2020;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 16.10.2020 / 09.11.2020.
5. К отчету прилагаются на 7 листах: (фотографии объекта).

Инициатор:

_____ Голубков Дмитрий Аркадьевич
(Ф.И.О.)

_____ (подпись)

Глава Одинцовского городского округа:

_____ Иванов Андрей Робертович
(Ф.И.О.)

_____ (подпись)



Дата «10» ноября 2020 г.

Приложение № 1
к отчету о реализации проекта
«Приобретение и установка оборудования для
кабинетов труда МБОУ Ликинская СОШ»

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

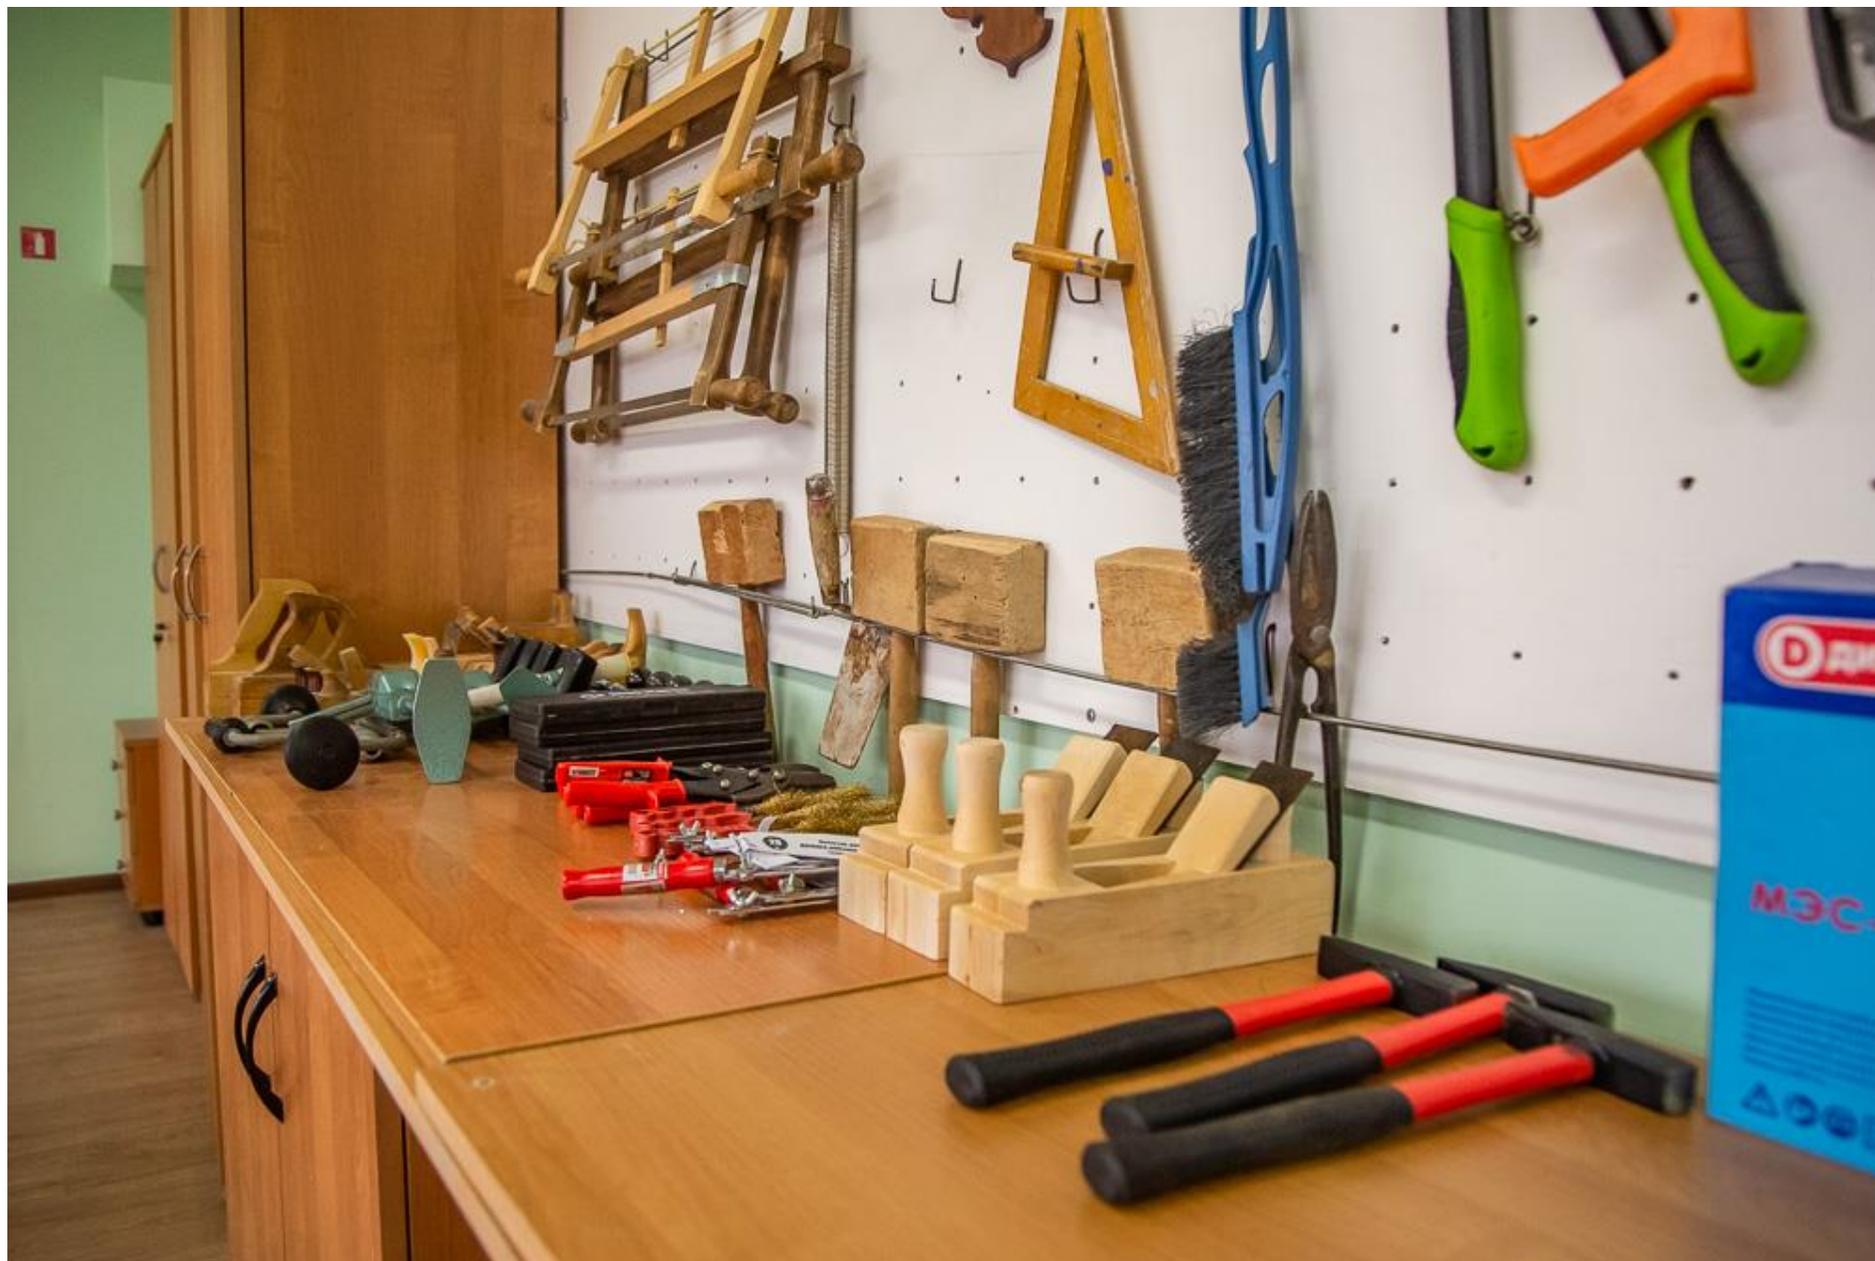


Фото №7

