



Общество с ограниченной ответственностью
«Моспроект 7»

121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
тел. 8 (499) 261-64-14

СРО-П-179-12122012

Утвержден
Постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
Московской области
от _____ № _____

Заказчик: ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Проект организации дорожного движения на период эксплуатации по объекту:
«Пристройка на 950 мест к МБОУ «Немчиновский лицей" по адресу:
Московская область, Одинцовский городской округ,
рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, д. 6»**

29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э

2025 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«Моспроект 7»

121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
тел. 8 (499) 261-64-14

СРО-П-179-12122012

Заказчик: ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Проект организации дорожного движения на период эксплуатации по объекту:
«Пристройка на 950 мест к МБОУ «Немчиновский лицей» по адресу:
Московская область, Одинцовский городской округ,
рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, д. 6»**

29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.Е. Титов

Н.В. Вологодина

2025 г.

Обозначение	Наименование	Примечание
29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.С	Содержание	Стр. 2
29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.ПЗ	Пояснительная записка	Стр. 3-4
29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.ВЗ	Ведомость дорожных знаков	Стр. 5
29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.ВР	Ведомость объемов работ	Стр. 6
	Чертежи:	
29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.ГЧ.1	Ситуационный план. Масштаб: Б/м	Стр. 7
29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.ГЧ.2	Схема искусственной неровности. Масштаб: Б/м	Стр. 8
29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.ГЧ.3	Схема ОДД на период экспл. Масштаб: 1:500	Стр. 9
	Приложение:	

Согласовано			

Взам. инв. №	Подп. и дата									
Инв. № подл.										
						29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.С				
						Пристройка на 950 мест к МБОУ «Немчиновский лицей» по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Проект организации дорожного движения на период эксплуатации		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Чувиллов							1	1
Проверил		Амелин								
ГИП		Вологодина								
						Содержание		ООО «Моспроект 7»		
Н.контр.		Амелин								

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью настоящей работы являлась разработка мероприятий по организации и безопасности дорожного движения на период эксплуатации пристройки на 950 мест к МБОУ «Немчиновский лицей» по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6

При выполнении работы решались следующие задачи:

1. Изучение дорожных условий, транспортно-планировочных характеристик объекта, существующей организации движения на прилегающей к объекту улично-дорожной сети (УДС).
2. Определение интенсивности движения транспортных потоков на УДС, находящейся в непосредственной близости к объекту проектирования.
3. Анализ степени загрузки транспортом и определение необходимых мероприятий по обеспечению пропускной способности и безопасности движения на УДС в районе объекта.
4. Разработка проектной документации по организации дорожного движения.

Проектные разработки выполнены в границах строительной зоны, представленной заказчиком.

Для получения характеристик транспортных потоков, необходимых для разработки и оценки проектных решений, было проведено соответствующее обследование.

Въезд-выезд автотранспорта на территорию Немчиновского лицея будет осуществляться с ул. Агрохимиков и бульвара Эйнштейна согласно схеме ПОДД №9.

На примыкающем к Немчиновскому лицео проезду со стороны ул. Агрохимиков расположена автостоянка на 6 м/м.

На примыкающем к Немчиновскому лицео проезду со стороны бульвара Эйнштейна расположена автостоянка на 19 м/м, в том числе 2 м/м для инвалидов.



Для исключения дорожно-транспортных происшествий, вызванных превышением скоростного режима, необходимо устройство искусственных неровностей (ИН) для принудительного снижения скорости согласно схеме ПОДД №9. На поверхность асфальта около ИН в обязательном порядке нанести дорожную раз-

29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.ПЗ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата			
Разработал	Чувилов					Пояснительная записка	Стадия	Лист
Проверил	Амелин							1
ГИП	Вологодина							2
							ООО «Моспроект 7»	
Н.контр.	Амелин							

Ведомость дорожных знаков

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ЗНАКА	ВИД	ИНДЕКС ПО ГОСТ Р 52289-2004	КОЛ-ВО, шт.
1	Искусственная неровность		1.17	9
2	Дети		1.23	3
3	Уступите дорогу		2.4	3
4	Въезд запрещен		3.1	6
5	Ограничение максимальной скорости		3.24	9
6	Ограничение максимальной скорости		3.24	1
7	Остановка запрещена		3.27	11
8	Стоянка запрещена		3.28	1
9	Движение прямо		4.1.1	1
10	Дорога с односторонним движением		5.5	2
11	Конец дороги с односторонним движением		5.6	2
12	Выезд на дорогу с односторонним движением		5.7.2	1
13	Пешеходный переход		5.19.1	8
14	Пешеходный переход		5.19.2	8
15	Искусственная неровность		5.20	10
16	Жилая зона		5.21	1
17	Конец жилой зоны		5.22	1
18	Парковка (парковочное место)		6.4	5
19	Расстояние до объекта		8.1.1	1
20	Расстояние до объекта		8.1.1	1
21	Расстояние до объекта		8.1.3	1
22	Расстояние до объекта		8.1.4	1
23	Зона действия		8.2.1	1
24	Зона действия		8.2.1	2
25	Зона действия		8.2.1	3
26	Зона действия		8.2.1	2
27	Зона действия		8.2.1	1
28	Зона действия		8.2.4	1
29	Способ постановки т/с на стоянку		8.6.1	5
30	Инвалиды		8.17	1
31	Работает эвакуатор		8.24	12


						29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.ВЗ		
						Пристройка на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей" по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6		
Изм.	Нуч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
Разработал	Чувилон					Проект организации дорожного движения на период эксплуатации	Стадия	Лист
Проверил	Амелин							1
ГИП	Вологодина					Ведомость дорожных знаков	000 "Моспроект 7"	
Н.контр.	Амелин							

Ведомость объемов работ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
Ограничивающее пешеходное ограждение перильного типа высотой 0,8м-1,0м	443,0 п.м.
Искусственная неровность сборно-разборной конструкции (длина хорды 0,7м, высота 0.06м, краевых элементов 2шт.)	1 шт. - 6,0м
Наземный пеш. переход, совмещенный с искусств. неровностью (длина хорды 6,2м, высота 0.07м)	1 шт. - 4,0м 1 шт. - 6,5м 1 шт. - 10,0м
Светофор Т.7	12 шт.
Столбики дорожные сигнальные	7 шт.


						29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.ВР			
						Пристройка на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей" по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6			
Изм.	Нуч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
						Проект организации дорожного движения на период эксплуатации	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чувилев							1	1
Проверил	Амелин					Ведомость объемов работ	ООО "Моспроект 7"		
ГИП	Вологодина								
Н.контр.	Амелин								

Пристройка на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей"

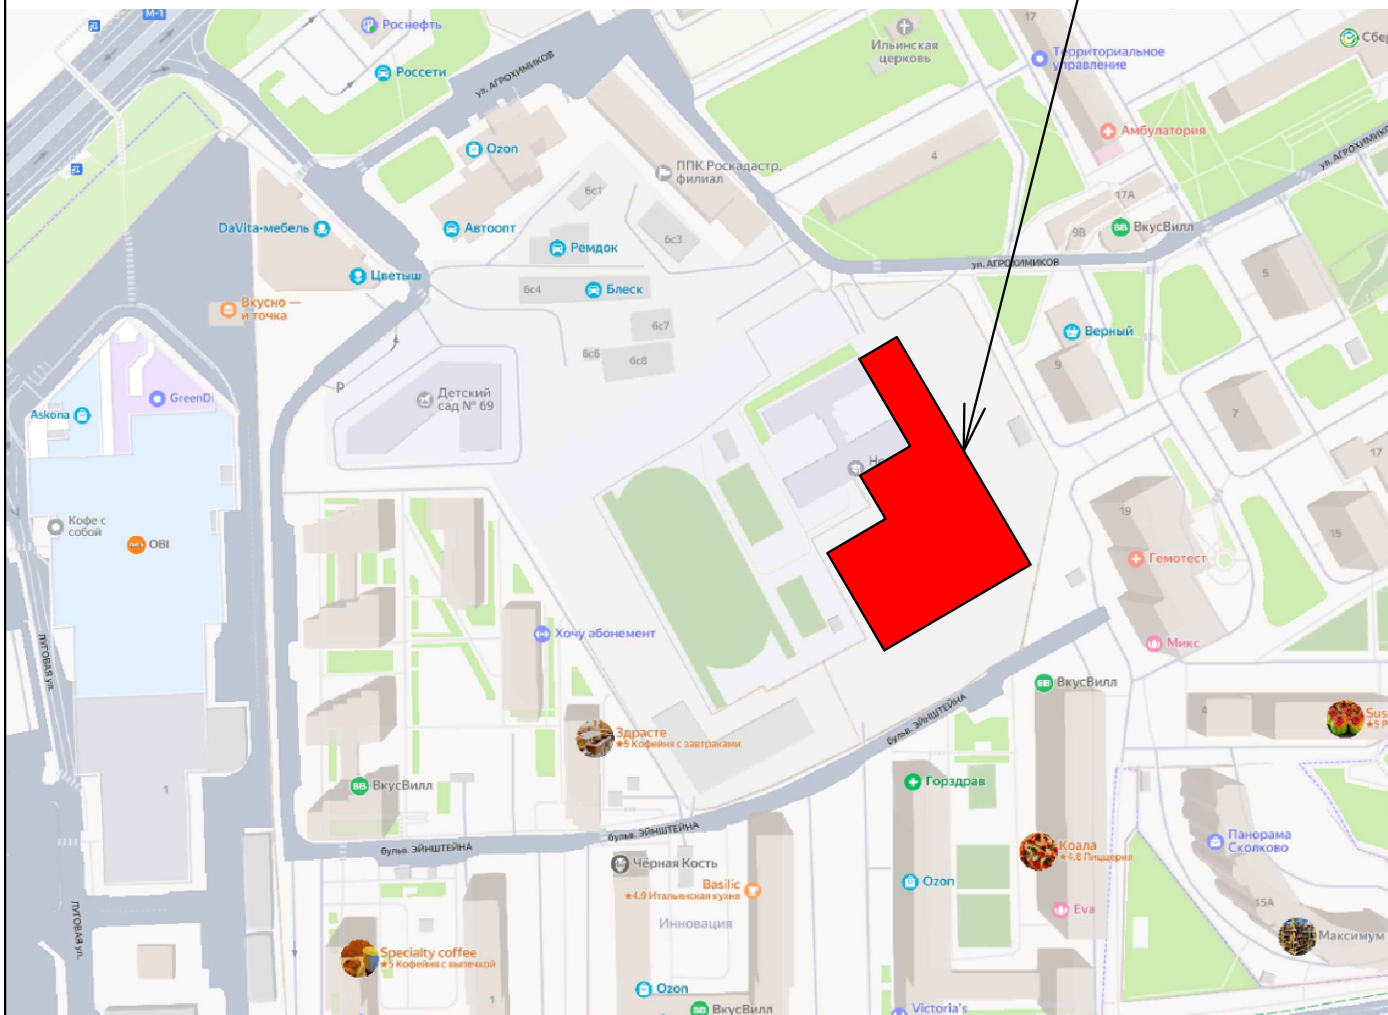


						29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.ГЧ.1			
						Пристройка на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей" по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6			
Изм.	Нуч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
						Проект организации дорожного движения на период эксплуатации	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чувилон							1	1
Проверил	Амелин					Ситуационный план Масштаб: Б/м	ООО "Моспроект 7"		
ГИП	Вологодина								
Н.контр.	Амелин								

Искусственная неровность (ИН) сборно-разборной конструкции ГОСТ Р 52605-2006
 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности"

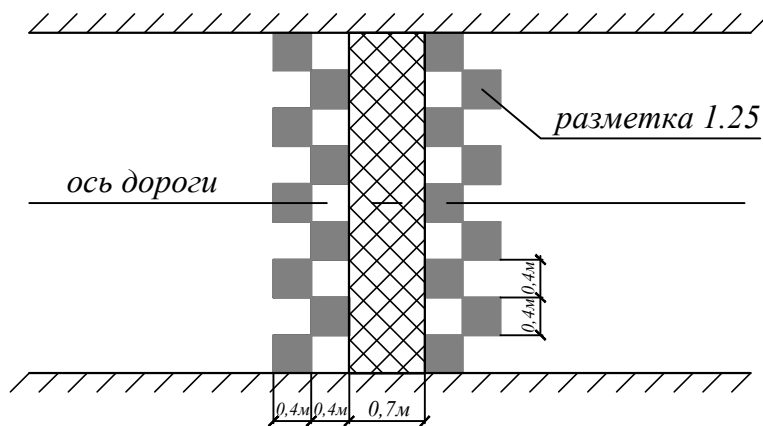

Конструкция сборно-разборной ИН

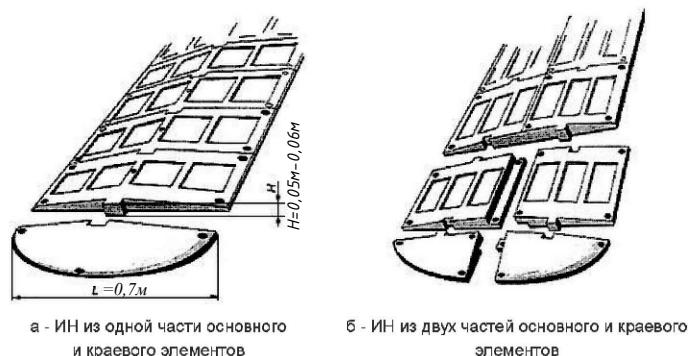

Длина ИН должна быть не менее ширины проезжей части.


Допустимое отклонение - не более 0,2м с каждой стороны дороги.

Сборно-разборная конструкция ИН может состоять из ряда однотипных геометрически совместимых основных и краевых элементов. Основной и краевой элементы могут состоять из одной (рисунок а) или двух частей (рисунок б), которые геометрически совместимы друг с другом и имеют отверстия для крепления к покрытию дороги. В конструкции должна быть предусмотрена возможность монтажа и демонтажа на покрытии дороги, а также замены отдельных ее элементов и частей с использованием специального инструмента. ИН должна иметь поверхность, обеспечивающую коэффициент сцепления в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597. Для обеспечения видимости в темное время суток на поверхность ИН должны быть нанесены световозвращающие элементы, ориентированные по направлению движения транспортных средств. Площадь световозвращающих элементов должна быть не менее 15% общей площади ИН. Световозвращающие элементы выполняют из полимерных лент или иных материалов в соответствии с ГОСТ Р 51256.

ИН устраивают на дорогах с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями на участках с искусственным освещением.

ИН устраивают на участках дорог с максимальным приближением к имеющимся мачтам искусственного освещения, а в необходимых случаях и с установкой около ИН новых опор наружного освещения. Уровень освещенности проезжей части на таких участках должен быть не менее 10 лк.

						29/07/ПР950НИ-ПОДД.Э.ГЧ.2		
						Пристройка на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей" по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6		
Изм.	Нуч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
Разработал	Чувиллов					Проект организации дорожного движения на период эксплуатации	Стадия	Лист
Проверил	Амелин							1
ГИП	Вологодина							1
						Схема искусственной неровности Масштаб: Б/м	ООО "Моспроект 7"	
Н.контр.	Амелин							

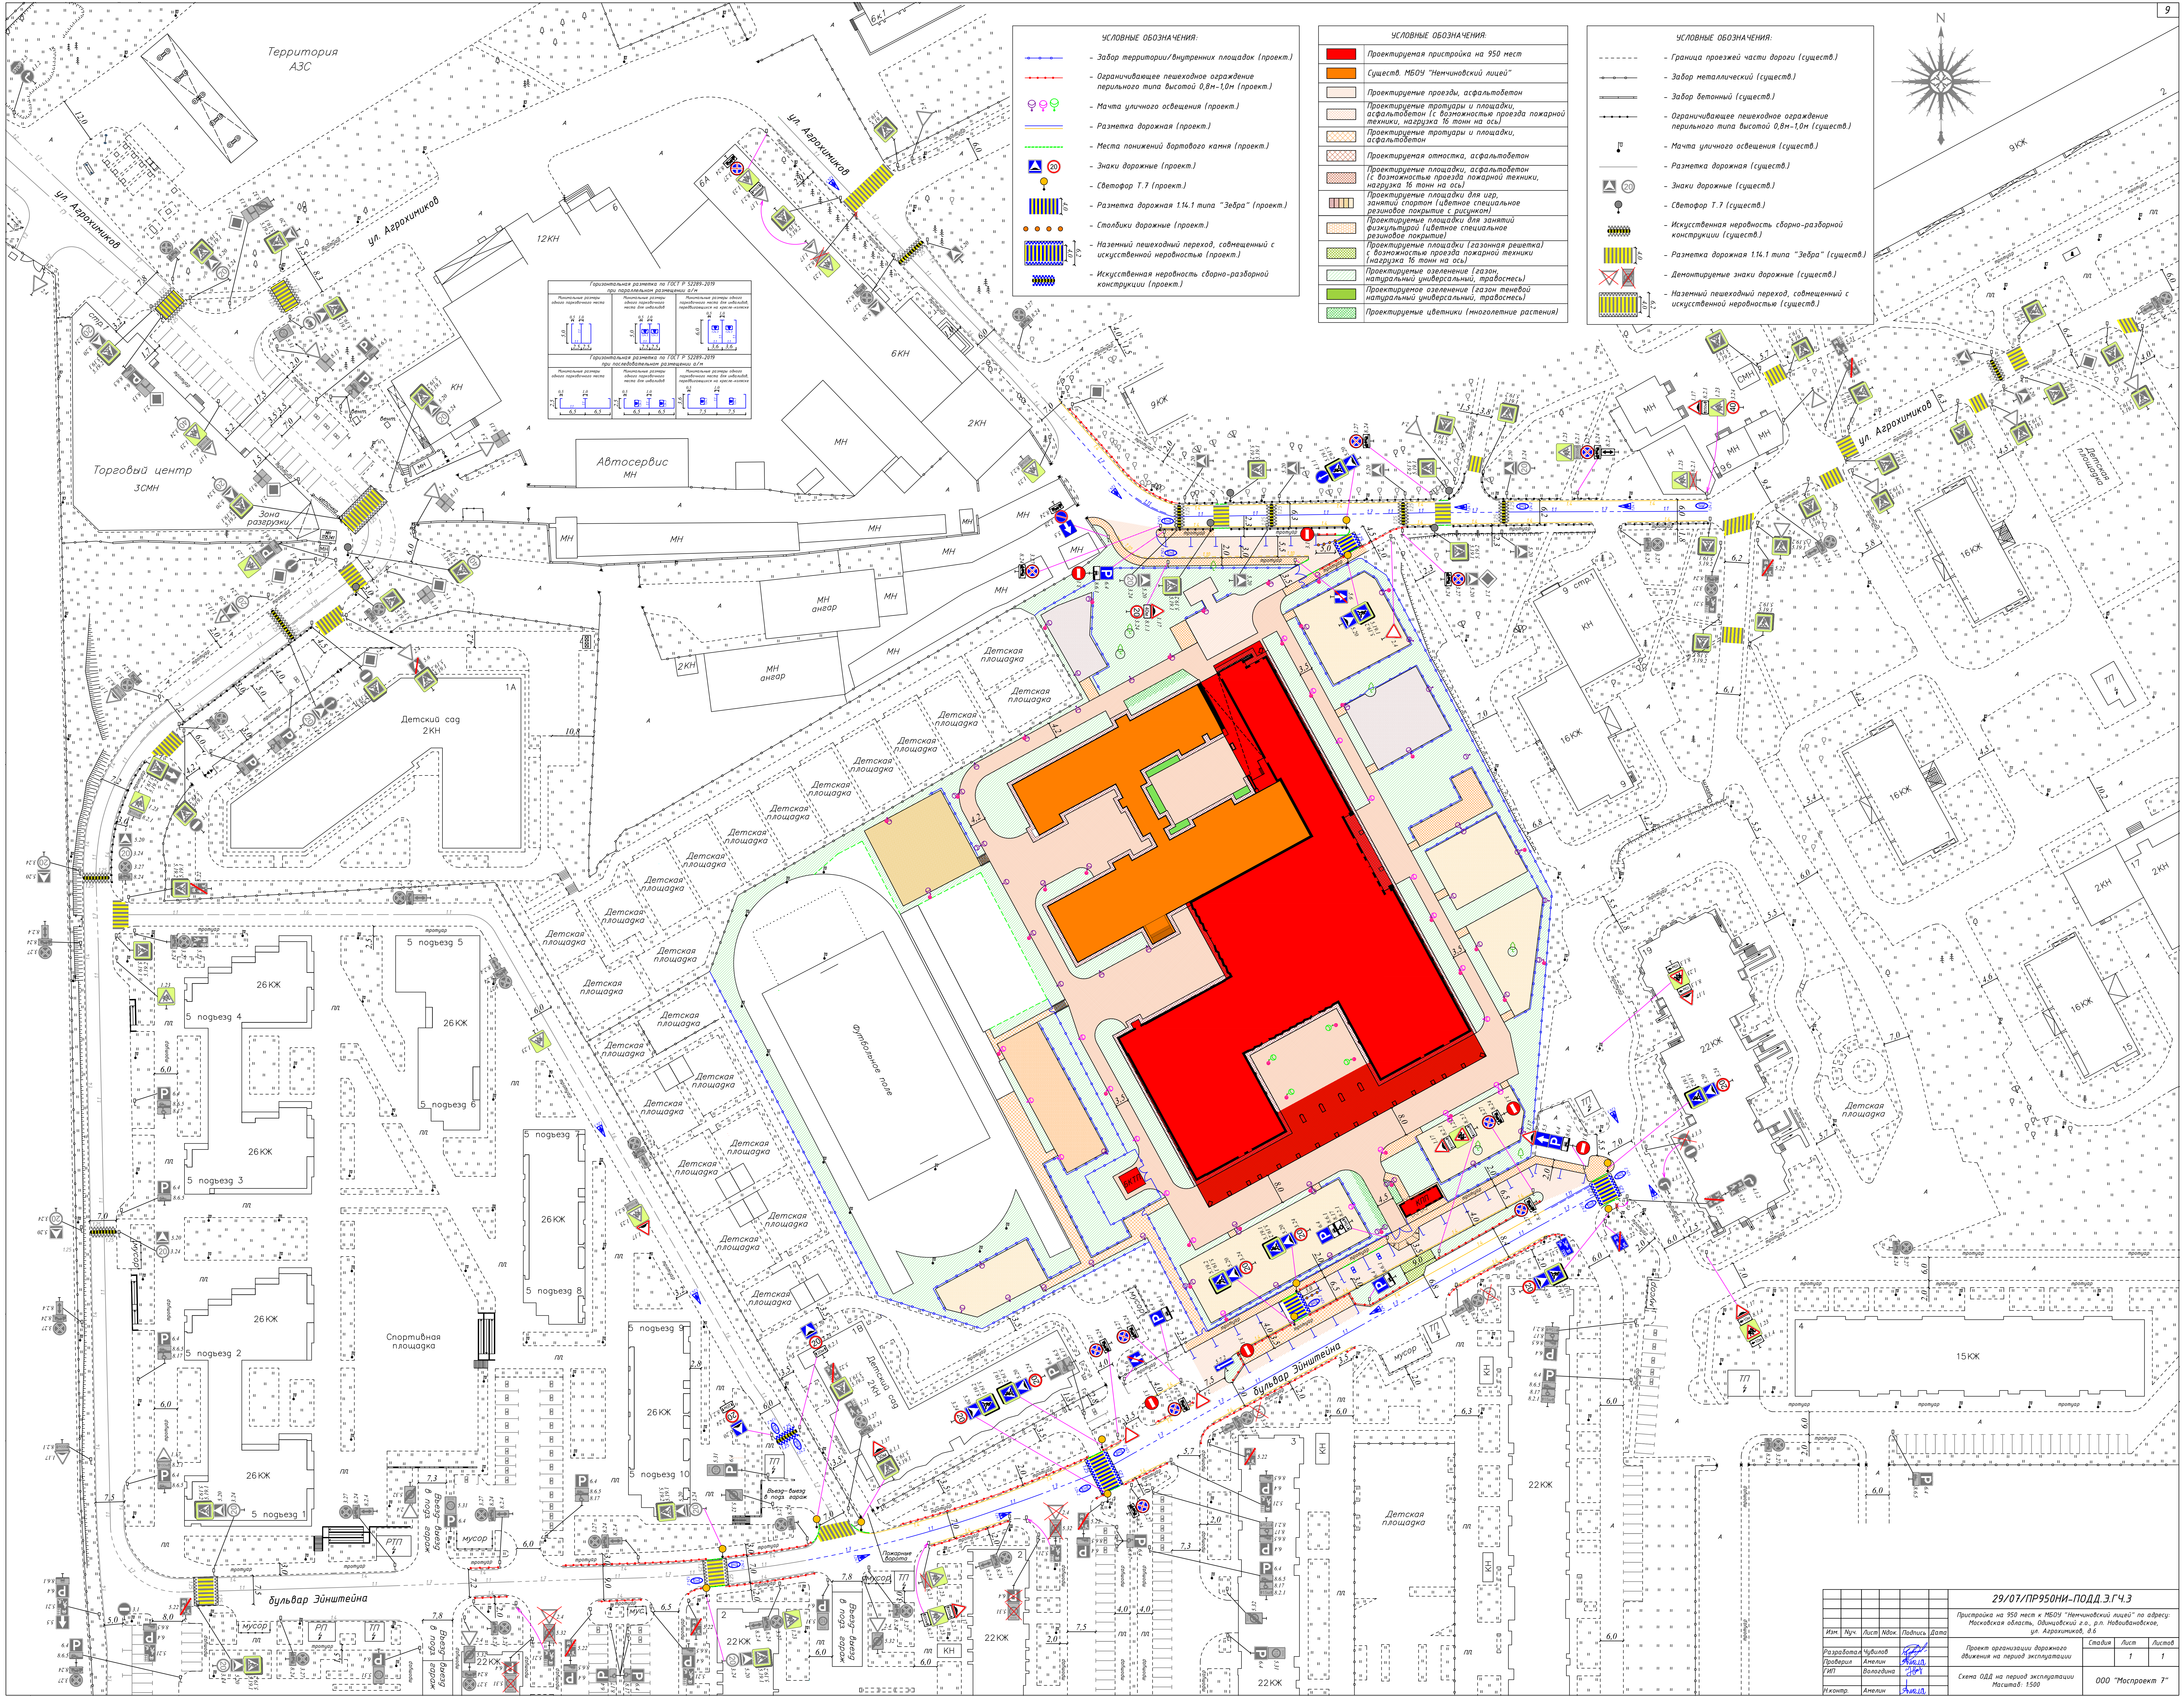

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- Забор территории/Внутренних площадок (проект).
 - Ограничивающее пешеходное ограждение перильного типа высотой 0,8м-1,0м (проект).
 - Мачта уличного освещения (проект).
 - Разметка дорожная (проект).
 - Места понижения бортового камня (проект).
 - Знаки дорожные (проект).
 - Светофор Т.7 (проект).
 - Разметка дорожная 1.14.1 типа "Зебра" (проект).
 - Столбики дорожные (проект).
 - Наземный пешеходный переход, совмещенный с искусственной неровностью (проект).
 - Искусственная неровность сборно-разборной конструкции (проект).

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- Проектируемая пристройка на 950 мест
 - Сущств. МБОУ "Немчиновский лицей"
 - Проектируемые проезды, асфальтобетон
 - Проектируемые тротуары и площадки, асфальтобетон (с возможностью проезда пожарной техники, нагрузка 16 тонн на ось)
 - Проектируемые тротуары и площадки, асфальтобетон
 - Проектируемая отмостка, асфальтобетон
 - Проектируемые площадки, асфальтобетон (с возможностью проезда пожарной техники, нагрузка 16 тонн на ось)
 - Проектируемые площадки для игр, занятий спортом (цветное специальное резиновое покрытие с рисунками)
 - Проектируемые площадки для занятий физкультурой (цветное специальное резиновое покрытие)
 - Проектируемые площадки (газонная решетка) с возможностью проезда пожарной техники (нагрузка 16 тонн на ось)
 - Проектируемое озеленение (газон, натуральные универсальные, травостесы)
 - Проектируемое озеленение (газон, натуральные универсальные, травостесы)
 - Проектируемые цветники (многолетние растения)

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- Граница проезжей части дороги (сущств.)
 - Забор металлический (сущств.)
 - Забор бетонный (сущств.)
 - Ограничивающее пешеходное ограждение перильного типа высотой 0,8м-1,0м (сущств.)
 - Мачта уличного освещения (сущств.)
 - Разметка дорожная (сущств.)
 - Знаки дорожные (сущств.)
 - Светофор Т.7 (сущств.)
 - Искусственная неровность сборно-разборной конструкции (сущств.)
 - Разметка дорожная 1.14.1 типа "Зебра" (сущств.)
 - Демонтируемые знаки дорожные (сущств.)
 - Наземный пешеходный переход, совмещенный с искусственной неровностью (сущств.)

Горизонтальная разметка на Т.02.01-2010

Рисунком разметки обозначены места для остановки	Рисунком разметки обозначены места для остановки	Рисунком разметки обозначены места для остановки
1.1.1	1.1.2	1.1.3

Горизонтальная разметка на Т.02.01-2010

Рисунком разметки обозначены места для остановки	Рисунком разметки обозначены места для остановки	Рисунком разметки обозначены места для остановки
1.1.4	1.1.5	1.1.6

29/07/ПР950НИ-ПОДД.ЭГЧ.3				
Пристройка на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей" по адресу: Могойская область, Ойуновский г.о., р.п. Немчиновский, ул. Агрохимиков, д.6				
Изм.	Нач.	Лист	Подпись	Дата
Разработчик	Утвержден	Лист	Подпись	Дата
Проектировщик	Утвержден	Лист	Подпись	Дата
Инженер	Утвержден	Лист	Подпись	Дата
Архитектор	Утвержден	Лист	Подпись	Дата
Страна	Лист	Подпись	Дата	
Масштаб: 1:500	000 "Мостпроект 7"			
